CARGO
MINISTERIO DE SALUD
Oficina Ejecutiva de Abastecimiento
MESA DE PARTES
12 AGO. 2021
RECIBIDO
HORA: 18:05
FIRMA

NOTA INFORMATIVA N° 1554 -2021-UAP-OA-OGA/MINSA

A : **Ing. PIO VLADIMIR CABREJOS BARRAGAN**
Director Ejecutivo
Oficina de Abastecimiento

Asunto : Evaluación del PAC MINSA correspondiente al mes de Julio 2021
Expediente 21-094662-001

Fecha : Lima, 11 de Agosto de 2021

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para saludarlo cordialmente e informar que se ha efectuado la Evaluación Mensual del Plan Anual de Contrataciones - PAC 2021 de la Unidad Ejecutora 001: Administración Central del Pliego 011: Ministerio de Salud correspondiente al mes de Julio del 2021.

Se adjunta la documentación en mención para los fines correspondientes.

Atentamente,

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
JOHANA NATALI BARRERA RAMIREZ
Unidad de Adquisiciones y Programación
OFICINA DE ABASTECIMIENTO

PROVEIDO N° 803 -2021-OA-OGA/MINSA

Visto la Nota Informativa N° 1554-2021-UAP-OA-OGA/MINSA que antecede, el suscrito lo hace suyo en todos sus extremos, por lo que se remite a la Oficina General de Administración-OGA, la evaluación del Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001: Administración Central del Pliego 011: Ministerio de Salud, correspondiente al mes de Julio del 2021

Lima, 11 de Agosto de 2021

EVALUACIÓN MENSUAL DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES - PAC 2021 - JULIO

(U.E 001: ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEL PLIEGO 011: MINISTERIO DE SALUD)

I. ASPECTOS GENERALES

El Plan Anual de Contrataciones es un instrumento de gestión que obedece en forma estricta y exclusiva a la satisfacción de las necesidades de la Entidad, las que a su vez provienen de todos y cada uno de los órganos y unidades orgánicas, en atención al cumplimiento de sus funciones y al logro de sus metas institucionales a lo largo del año fiscal correspondiente.

Es una herramienta efectiva para el uso racional y estratégico de los recursos públicos, en vista que permite desarrollar habilidades y competencias para su programación, elaboración, ejecución, control y evaluación, dentro de un marco de gerencia efectiva.

En ese sentido, siendo el Plan Anual de Contrataciones un importante instrumento de gestión, el cual se ubica en la primera fase del procedimiento de las contrataciones públicas, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 7.8 del seguimiento del Plan Anual de Contrataciones, de la Directiva Nº 002-2019-OSCE/CD, se presenta el siguiente informe sobre la ejecución del Plan Anual de Contrataciones (PAC) del Ministerio de Salud correspondiente al mes de JULIO de 2021.

II. FINALIDAD

El presente informe tiene la finalidad de brindar información acerca del cumplimiento de la ejecución del PAC, a fin de adoptar, de ser el caso, las medidas correctivas necesarias para alcanzar las metas y objetivos previstos en el Plan Operativo Institucional – POI 2021 del Ministerio de Salud.

III. ALCANCE

Mes de JULIO de 2021.

IV. BASE LEGAL

- Ley Nº 30225 - Ley de Contrataciones del Estado, modificada por Decreto Legislativo N°1341 y 1444 y Decreto Supremo N°82-2019-EF – TUO Ley 30225.
- Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo Nº 344-2018-EF y su modificatoria Decreto Supremo N° 377-2019-EF.
- Directiva Nº 002-2019-OSCE/CD.

V. ASPECTOS ESPECIFICOS

5.1. PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES – INICIAL

El Plan Anual de Contrataciones del Ministerio de Salud, fue aprobado mediante Resolución Secretarial Nº 012-2021/MINSA, de fecha 22 de enero de 2021, y publicado en el Portal del SEACE el 26 de enero del 2021, el citado Plan se aprobó con los procedimientos de selección que se indican a continuación:

Cuadro N° 01: Plan Anual de Contrataciones Inicial – 2021

TIPO PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	ABREV	PAC INICIAL 2021	
		CANTIDAD	MONTO (S/)
Adjudicación Simplificada	AS	2	522,410.71
Compras por catálogo (Acuerdo Marco)	CM	1	600,000.00
Concurso Público	CP	2	2,124,855.00
Contratación Directa	CD	6	35,647,600.00
Licitación Pública	LP	3	10,799,803.72
TOTAL		**14**	**49,694,669.43**

La distribución por los tipos de procedimientos de selección, se muestran gráficamente a continuación:

Gráfico N° 01: Distribución de los Procedimientos de Selección del PAC Inicial 2021

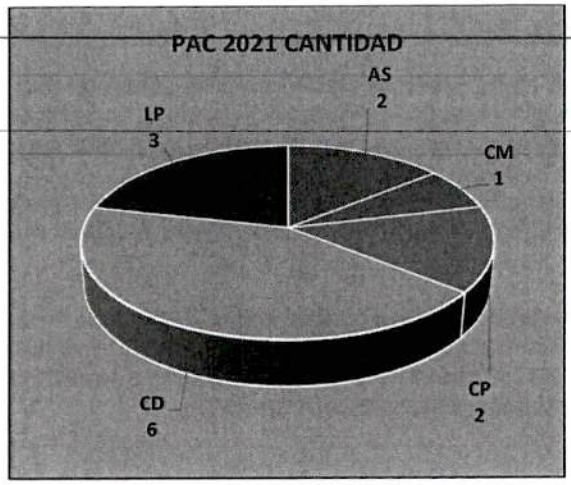

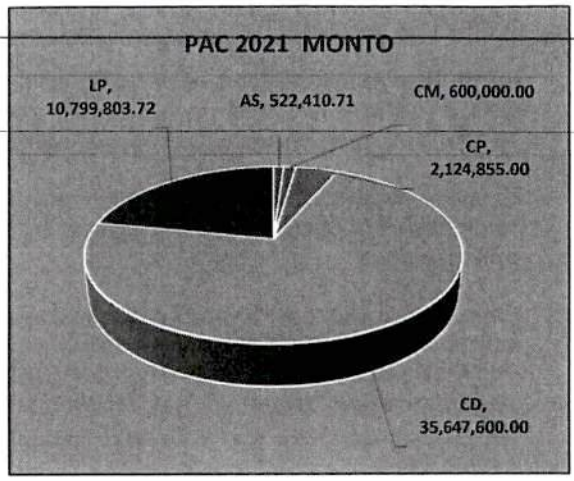

5.2. RESUMEN DEL PAC INICIAL

5.2.1 Por lo expuesto precedentemente, el Plan Anual de Contrataciones PAC 2021 del MINSA inicial fue de acuerdo a lo siguiente:

Cuadro N° 02: Aprobación del PAC 2021

Inicial/ Modificaciones	Documento aprobatorio	Fecha de Aprobación
INICIAL	Resolución Secretarial Nº 012-2021/MINSA	22/01/2021

5.3. MODIFICACIONES AL PLAN: INCLUSIONES, EXCLUSIONES DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN

Cuadro de Plan Anual de Contrataciones al 30 de Junio de 2021

TIPO PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	PAC 2021		CONVOCADO	
	CANT	MONTO (S/)	CANT	MONTO (S/)
ACUERDO MARCO	21	21,965,282.63	21	21,625,357.38
ADJUDICACION SIMPLIFICADA	19	5,810,179.60	13	4,823,766.83
CONCURSO PUBLICO	7	9,977,547.16	4	7,490,716.56
CONTRATACION DIRECTA	56	205,176,387.78	32	139,747,955.75
CONTRATACIÓN INTERNACIONAL	4	431,341.38	2	410,720.00
LICITACION PUBLICA	6	12,044,791.13	0	0
SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	2	3,199,634.84	0	0
TOTAL	**115**	**258,605,164.52**	**72**	**174,098,516.52**

El Plan Anual de Contrataciones en el mes de JULIO ha sido modificado a través de tres (03) Resoluciones Directorales, de acuerdo a lo siguiente:

- **Vigésima** modificatoria a través de la Resolución Directoral N° 223-2021-OGA-MINSA, de fecha 06 de julio de 2021, se aprobó la vigésima modificatoria del Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001 Administración Central, Pliego 11 Ministerio de Salud, se incluyó cinco (05) procedimientos de selección, según el siguiente detalle:

Inclusiones:

N° Ref.	Tipo de Proced.	Objeto Contrata	Descripción	Nro Ítems	Valor Estimado	FF.	Mes Convc.	Área Usuaria
120	Contratación Directa	Bien	ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS DENOMINADOS: BOMBA DE INFUSION VOLUMETRICA DE DOS CANALES (COVID 19) PARA BRINDAR APOYO EN LA ATENCION MEDICAPOR LOS CASOS PRESENTADOS POR INFECCION CORONAVIRUS (97 UNIDADES)	1	1,013,200.00	3-19	Julio	DGOS
121	Acuerdo Marco	Bien	ADQUISICION DE 02 ESCANER DE ALTA PRODUCCION	1	84,023.17	1-00	Julio	SG
122	Acuerdo Marco	Bien	ADQUISICION DE 20 TABLETAS PARA LA DIGEMID	1	58,775.46	2-09	Julio	DIGEMID
123	Contratación Directa	Bien	ADQUISICION DE MASCARILLAS FACIALES DE USO COMUNITARIO (30 DIAS DE PLAZO DE ENTREGA)	1	15,703,000.00	1-00	Julio	DGIESP
124	Contratación Directa	Bien	ADQUISICION DE MASCARILLAS FACIALES DE USO COMUNITARIO (15 DIAS DE PLAZO DE ENTREGA)	8	6,660,500.00	1-00	Julio	DGIESP

- **Vigésima Primera** modificatoria a través de la Resolución Directoral N° 234-2021-OGA-MINSA, de fecha 16 de julio de 2021, se aprobó la vigésima primera modificatoria del Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001 Administración Central, Pliego 11 Ministerio de Salud, se incluyó cinco (05) procedimiento de selección, según el siguiente detalle:

Inclusiones

N° Ref.	Tipo de Proced.	Objeto Contrata	Descripción	Nro Ítems	Valor Estimado	FF.	Mes Convc.	Área Usuaria
125	Contratación Directa	Bien	ADQUISICION DE MASCARILLAS FACIALES DE USO COMUNITARIO (15 DIAS DE PLAZO DE ENTREGA)	12	12,054,500.00	1-00	Julio	DGIESP
126	Contratación Directa	Bien	ADQUISICION DE BIENES CONSIDERADOS EN EL PLAN DE PREPARACION Y RESPUESTA ANTE LA SEGUNDA OLA PANDEMICA POR COVID-19 (MAMELUCO)	1	336,000.00	4-13	Julio	DGOS
127	Acuerdo Marco	Servicio	ADQUISICION DE 04 COMPUTADORAS PERSONAL PORTATIL	1	55,376.63	1-00	Julio	DGIESP
128	Acuerdo Marco	Servicio	ADQUISICION DE 03 COMPUTADORAS PERSONAL PORTATIL DE ALTA GAMA	1	69,936.58	1-00	Julio	DINFOSALUD
129	Acuerdo Marco	Servicio	ADQUISICION DE PAPEL BOND DE 80 GR TAMAÑO A4	1	353,532.43	1-00	Julio	VARIOS

MINISTERIO DE SALUD · Andy Castillo Díaz · V°B° · OFICINA DE ABASTECIMIENTO

- **Vigésima Segunda** modificatoria a través de la Resolución Directoral N° 237-2021-OGA-MINSA, de fecha 22 de julio de 2021, se aprobó la vigésima segunda modificatoria del Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001 Administración Central, Pliego 11 Ministerio de Salud, se incluyó cuatro (04) procedimientos de selección, según el siguiente detalle:

Inclusiones:

° Ref.	Tipo de Proced.	Objeto Contrata	Descripción	Nro Ítems	Valor Estimado	FF.	Mes Convc.	Área Usuaria
130	Adjudicación Simplificada	Servicio	CONTRATACION DEL SERVICIO DE PUBLICACION DE DECLARACIONES JURADAS DE INGRESOS BIENES Y RENTAS DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PUBLICOS DELMINISTERIO DE SALUD EN EL DIARIO OFICIAL EL PERUANO	1	84,330.00	1-00	AGOSTO	OGRH
131	Contratación Directa	Bien	ADQUISICION DE BALONES (CILINDROS) DE 10M3 DE CAPACIDAD PARA EL SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL A LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL MINISTERIO DE SALUD (4515 UNIDADES)	1	7,449,750.00	1-00	AGOSTO	DGOS

132	Contratación Directa	Bien	ADQUISICION DE MASCARILLAS FACIALES DE USO COMUNITARIO (15 DIAS DE PLAZO DE ENTREGA)	1	494,994.50	1-00	AGOSTO	DGIESP
133	Acuerdo Marco	Bien	ADQUISICION DE IMPRESORA LASER MONOCROMATICA A4	1	89,760.96	2-09	AGOSTO	DIGEMID

Exclusiones:

Ref. PAC	Descripción	Tipo de Selección	Valor Estimado PAC (En Soles)	Motivo de Exclusión
86	Adquisición de Balones (Cilindros) de 10 M3 de capacidad para el Suministro De Oxigeno Medicinal A Los Establecimientos de Salud del Ministerio de Salud (2455 unidades)	Contratación Directa	4,148,950.00	El proveedor CONSORCIO DEFM S.A.C., no cumplió con sus obligaciones contractuales, resolviéndose el vínculo contractual con el mismo se adjunta carta mediante el cual la Entidad resuelve la Orden de Compra
87	Adquisición de Balones (Cilindros) de 10 M3 de capacidad para el Suministro De Oxigeno Medicinal A Los Establecimientos de Salud del Ministerio de Salud (2000 unidades)	Contratación Directa	3,300,000.00	El proveedor CONSORCIO ISAB5 E.I.R.L., no cumplió con sus obligaciones contractuales, resolviéndose el vínculo contractual con el mismo se adjunta carta mediante el cual la Entidad resuelve la Orden de Compra

5.4. RESUMEN DE LAS MODIFICACIONES AL PAC

5.4.1. Por lo expuesto precedentemente, el Plan Anual de Contrataciones – PAC 2021 del MINSA, en el mes de Julio fue modificado de acuerdo a lo siguiente:

Cuadro N° 03: Modificaciones al PAC 2021 – MINSA

PAC Modificaciones	Documento aprobatorio	Fecha de Aprobación	Cantidad		Valor	
			Incluidos	Excluidos	Incluidos	Excluidos
20	Resolución Directoral N° 223-2021-OGA/MINSA	06/07/2021	5	0	23,519,498.63	0.00
21	Resolución Directoral N° 234-2021-OGA/MINSA	16/07/2021	5	0	12,869,345.64	0.00
22	Resolución Directoral N° 237-2021-OGA/MINSA	22/07/2021	4	2	8,118,835.46	7,448,950
	TOTAL		**14**	**0**	**44,507,679.73**	**7,448,950.00**

Cuadro de Inclusiones mes de Julio 2021

TIPO PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	PAC MODIFICADO 2021 INCLUSIONES	
	CANTIDAD	MONTO (S/)
Compras por catálogo (Convenio Marco)	6	711,405.23
Adjudicación Simplificada	1	84,330.00
Contratación Directa	7	42,698,744.50
TOTAL	**14**	**44,507,679.73**

MINISTERIO DE SALUD - OFICINA DE ABASTECIMIENTO - Andy Castillo Diaz - V°B°

5.4.2. Asimismo, se precisa que el Plan Anual de Contrataciones - PAC 2021 del MINSA, queda actualizado de acuerdo a las modificaciones realizadas, con los siguientes procedimientos de selección vigentes:

Cuadro N° 04: Procedimientos de Selección del PAC 2021 – Modificado al mes de Julio 2021

TIPO PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	PAC MODIFICADO 2021	
	CANT	MONTO (S/)
ACUERDO MARCO	27	22,676,687.86
ADJUDICACION SIMPLIFICADA	20	5,894,509.60
CONCURSO PUBLICO	7	9,977,547.16
CONTRATACION DIRECTA	61	239,469,172.28
CONTRATACIÓN INTERNACIONAL	4	431,341.38
LICITACION PUBLICA	6	12,044,791.13
SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	2	3,199,634.84
TOTAL	**127**	**293,693,684.25**

5.4.3. La distribución por los tipos de procedimientos de selección, se muestran gráficamente a continuación:

Gráfico N° 01: Distribución Montos de los Procedimientos de Selección del PAC 2021 – Modificado al mes de Julio 2021

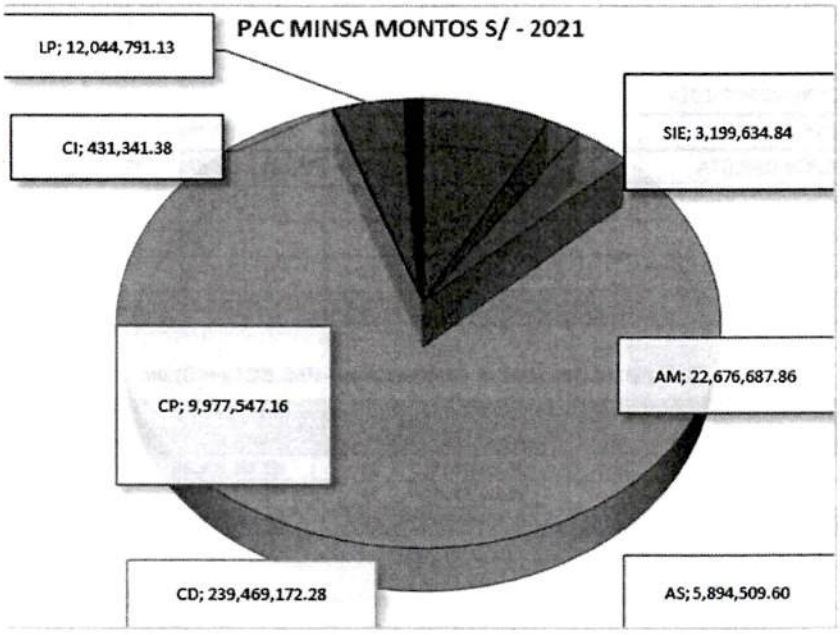

Gráfico N° 02: Distribución Porcentual de los Procedimientos de Selección del PAC 2021 – Modificado al mes de Julio 2021

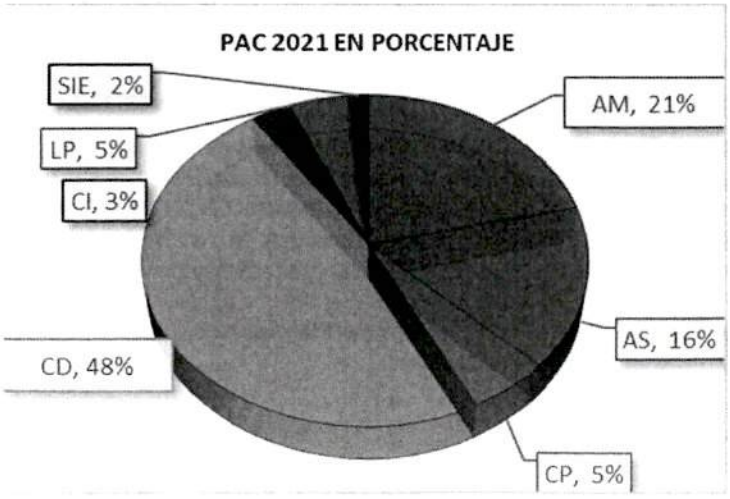

VI. EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES

6.1. La Ejecución del Plan Anual de Contrataciones al mes de Julio 2021, presenta el siguiente resumen:

Cuadro N° 05: Ejecución del Plan Anual de Contrataciones – PAC 2021 al 31 de Julio de 2021

Variables	Programados en el PAC al 31 de Julio	Convocados al-31-07-2021(*)	Avance del PAC (%)
Cantidad	127	91	71.65 %
Monto	293,693,684.25	193,211,949.42	65.79 %

(*) Se precisa que el monto consignado corresponde al Valor Estimado del procedimiento de selección registrado en el PAC al 31 de Julio de 2021.

6.2. Del cuadro citado precedentemente, se concluye que al 31 de Julio de 2021, se convocó noventa y un (91) procedimientos de selección de un total de (127) ciento veintisiete programados en lo que va del ejercicio presupuestal, conforme al siguiente detalle:

Ejecución del Plan Anual de Contrataciones – PAC 2021 por Tipo de Procedimiento de Selección

TIPO PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	PAC MODIFICADO 2021		CONVOCADO		POR CONVOCAR		CONVOCADO	CONVOCADO
	CANT	MONTO (S/)	CANTIDAD	MONTO (S/)	CANTIDAD	MONTO (S/)	% CANT	% MONTO
ACUERDO MARCO	27	22,676,687.86	27	22,676,687.86	0	0.00	**100.00%**	**100.00%**
ADJUDICACION SIMPLIFICADA	20	5,894,509.60	13	4,823,766.83	7	1,070,742.77	**65.00%**	**81.83%**
CONCURSO PUBLICO	7	9,977,547.16	5	8,647,547.16	2	1,330,000.00	**71.43%**	**86.67%**
CONTRATACION DIRECTA	61	239,469,172.28	43	156,440,315.07	18	83,028,857.21	**70.49%**	**65.33%**
CONTRATACIÓN INTERNACIONAL	4	431,341.38	2	410,720.00	2	20,621.38	**50.00%**	**95.22%**
LICITACION PUBLICA	6	12,044,791.13	0	0.00	6	12,044,791.13	**0.00%**	**0.00%**
SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	2	3,199,634.84	1	212,912.50	1	2,986,722.34	**50.00%**	**6.65%**
TOTAL	**127**	**293,693,684.25**	**91**	**193,211,949.42**	**36**	**100,481,734.83**	**71.65%**	**65.79%**

Ejecución del Plan Anual de Contrataciones – PAC 2021 por Objeto de Contratación

TIPO PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	PAC MODIFICADO 2021		CONVOCADO		POR CONVOCAR		CONVOCADO	CONVOCADO
	CANT	MONTO (S/)	CANT	MONTO (S/)	CANT	MONTO (S/)	% CANT	% MONTO
BIENES	**92**	**257,373,885.97**	**68**	**163,208,059.23**	**24**	**94,165,826.74**	**73.91%**	**63.41%**
SERVICIO	**35**	**36,319,798.28**	**23**	**30,003,890.19**	**12**	**6,315,908.09**	**65.71%**	**82.61%**
TOTAL	**124**	**287,493,880.53**	**91**	**193,211,949.42**	**33**	**94,281,931.11**	**73.39%**	**67.21%**

Ejecución del Plan Anual de Contrataciones – PAC 2021 por Estado Situacional

TIPO PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	EN PROCESO		ADJUDICADO		CONSENTIDO		CONTRATADO		CANCELADO		DESIERTO	
	CANTIDAD	MONTO (S/)	CANTIDAD	MONTO (S/)	CANTIDAD	MONTO (S/)	CANTIDAD	MONTO (S/)	CANTIDAD	MONTO (S/)	CANTIDAD	MONTO (S/)
ACUERDO MARCO	7	5,965,998.42					20	12,923,854.44				
ADJUDICACION SIMPLIFICADA	10	2,286,971.40			1	197,920.00			1	350,000.00	1	461,244.86
CONCURSO PUBLICO	2	4,956,097.60					3	4,141,449.56				
CONTRATACION DIRECTA	3	1,821,200.00	3	1,828,179.32			37	152,790,935.75				
CONTRATACIÓN INTERNACIONAL							2	412,656.00				
SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	1	212,912.50										
TOTAL	23.00	15,243,179.92	3.00	1,828,179.32	1.00	197,920.00	62.00	170,268,895.75	1.00	350,000.00	1.00	461,244.86

*La Adjudicación Simplificada 008-2021-MINSA "Servicio de Toma de Inventario Físico de Bienes Muebles Valorización y Conciliación de Activos Fijos y Bienes No Depreciables de la Unidad Ejecutora 001- Administración Central del MINSA ejercicio 2020" fue CANCELADO mediante Resolución Directoral 001-2021-OA-OGA/MINSA

** La Adjudicación Simplificada 011-2021-MINSA Adquisición de Archivadores Móviles o Rodantes fue declarado desierto por falta de propuestas válidas y a la fecha se encuentra en reformulación de Actos Preparatorios.

6.3. En los siguientes gráficos se muestra lo convocado en el Plan Anual de Contrataciones 2021 al 31 de Julio de 2021, por cantidad, importe y tipo procedimiento de selección:

MINISTERIO DE SALUD – Unidad de Adquisiciones – Andy Castillo Díaz – V°B° – OFICINA DE ABASTECIMIENTO

Se precisa que en el mes de Julio se programó once (11) procedimientos de selección, lográndose convocar siete (07) de ellos llegando al 63.63 % de convocatoria en relación a la cantidad de procedimientos programados en julio, quedando pendiente la convocatoria de cuatro (04) procedimientos de selección de los cuales 04 son Contrataciones Directas que se encuentran pendientes de regularización.

VII. PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN POR CONVOCAR

7.1 De los procedimientos de selección programados en el Plan Anual de Contrataciones 2021, se encuentran por convocar treinta y seis (36) procedimientos de selección programados de la siguiente manera:

Cuadro N° 10: Procedimientos de Selección por Convocar al 31 de julio de 2021

TIPO PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	PAC MODIFICADO 2021		POR CONVOCAR	
	CANT	MONTO (S/)	CANTIDAD	MONTO (S/)
ACUERDO MARCO	27	22,676,687.86	0	0.00
ADJUDICACION SIMPLIFICADA	20	5,894,509.60	7	1,070,742.77
CONCURSO PUBLICO	7	9,977,547.16	2	1,330,000.00
CONTRATACION DIRECTA	61	239,469,172.28	18	83,028,857.21
CONTRATACIÓN INTERNACIONAL	4	431,341.38	2	20,621.38
LICITACION PUBLICA	6	12,044,791.13	6	12,044,791.13
SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	2	3,199,634.84	1	2,986,722.34
TOTAL	**127**	**293,693,684.25**	**36**	**100,481,734.83**

VIII. CONCLUSIONES

8.1. De los 127 procedimientos de selección programados en el PAC 2021, se convocaron noventa y un (91) procedimientos de selección, llegando a un avance del 71.65 % en función a la cantidad de procedimientos programados, y por el valor de S/ 193,211,949.42 (Ciento noventa y tres millones doscientos once mil novecientos cuarenta y nueve con 42/100 Soles) equivalente al 65.79%.

8.2 Se precisa que en el mes de Julio se programó once (11) procedimientos de selección, lográndose convocar siete (07) procedimientos de selección llegando al 63.63 % de convocatoria en relación a la cantidad de procedimientos programados en julio, quedando pendiente la convocatoria de cuatro (04) procedimientos de selección los cuales son Contrataciones Directas que se encuentran pendientes de regularización.

8.3 -La Adjudicación Simplificada 008-2021-MINSA "Servicio de Toma de Inventario Físico de Bienes Muebles Valorización y Conciliación de Activos Fijos y Bienes No Depreciables de la Unidad Ejecutora 001- Administración Central del MINSA ejercicio 2020" fue CANCELADO mediante Resolución Directoral 001-2021-OA-OGA/MINSA
-La Adjudicación Simplificada 011-2021-MINSA Adquisición de Archivadores Móviles o Rodantes fue declarado desierto por falta de propuestas válidas y a la fecha se encuentra en reformulación de Actos Preparatorios.

8.4 Respecto a los seis (06) procesos programados para la Compra Corporativa Facultativa de Medicamentos y Dispositivos Médicos que serán convocados a través del CENARES, se ha verificado que se ha convocado la SIE-014-2021-CENARES quedando pendiente cinco (05) procesos según coordinación telefónica dichos procedimientos a la fecha se encuentran en etapa de Actos Preparatorios y en breve serán convocados.

9 RECOMENDACIÓN

9.2 Se recomienda que las áreas usuarias del MINSA remitan sus requerimientos, especificaciones técnicas y/o términos de referencia, debidamente formulados y con la debida anticipación que permita su atención oportuna de acuerdo a los plazos de ley establecidos en la normativa de contrataciones, a fin de que los bienes y/o servicios contratados satisfagan sus necesidades en la oportunidad requerida y permitan alcanzar las metas programadas en el Plan Operativo Institucional para cada una de ellas.

Gráfico N° 03: Ejecución del Plan Anual de Contrataciones – PAC 2021 por Cantidad

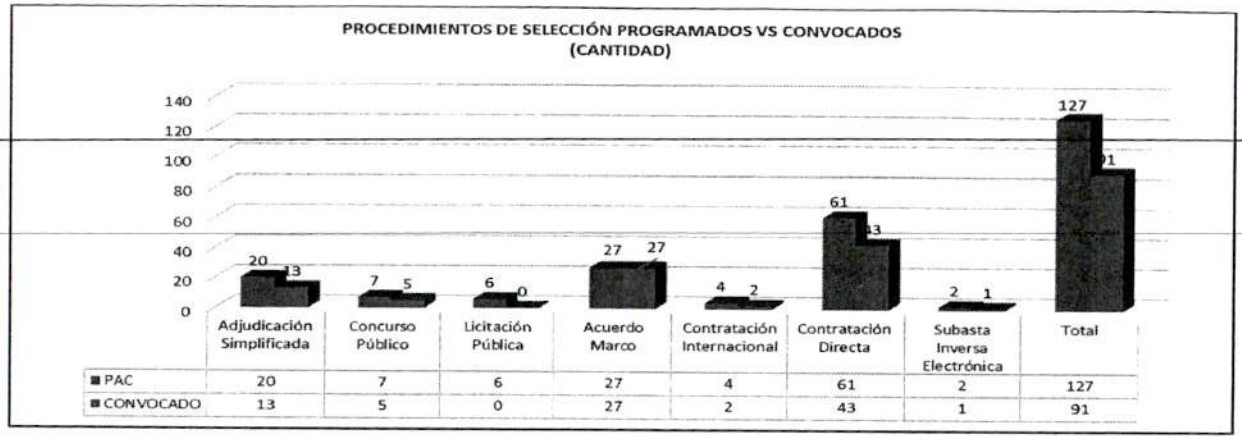

Gráfico N° 04: Ejecución del Plan Anual de Contrataciones – PAC 2021 por Valores

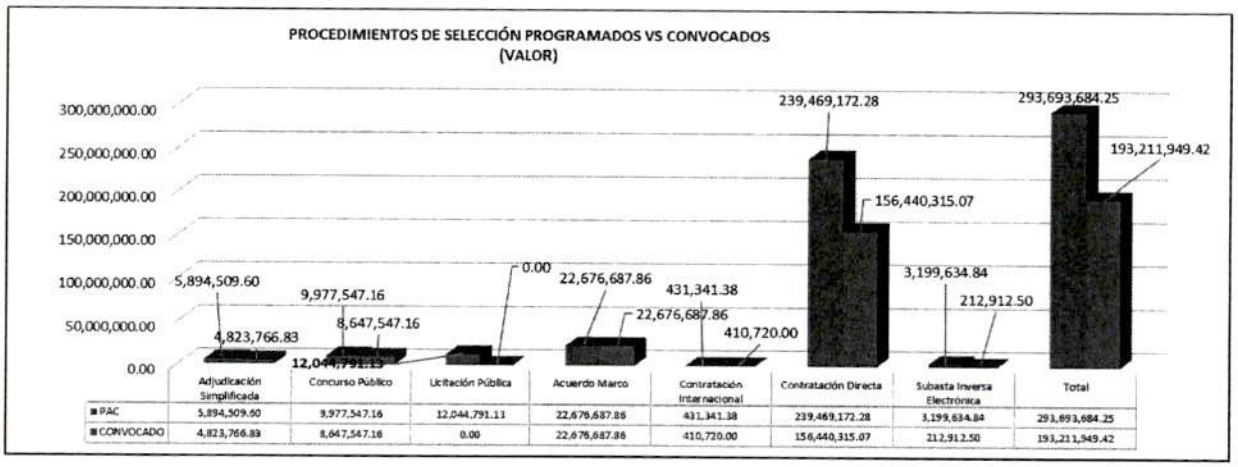

6.4. La ejecución del Plan Anual de Contrataciones de los procedimientos programados en el mes de julio de 2021, se presenta de acuerdo a lo siguiente:

Cuadro : Ejecución del Plan Anual de Contrataciones – PAC 2021 al mes de JULIO de 2021.

TIPO PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	OCTUBRE	NOVIEMBRE	TOTAL
PROGRAMADO	2	8	35	24	18	23	11	3	1	2	127
CONVOCADO SEGÚN PROGRAMADO	2	7	29	17	15	14	7	0	0	0	91

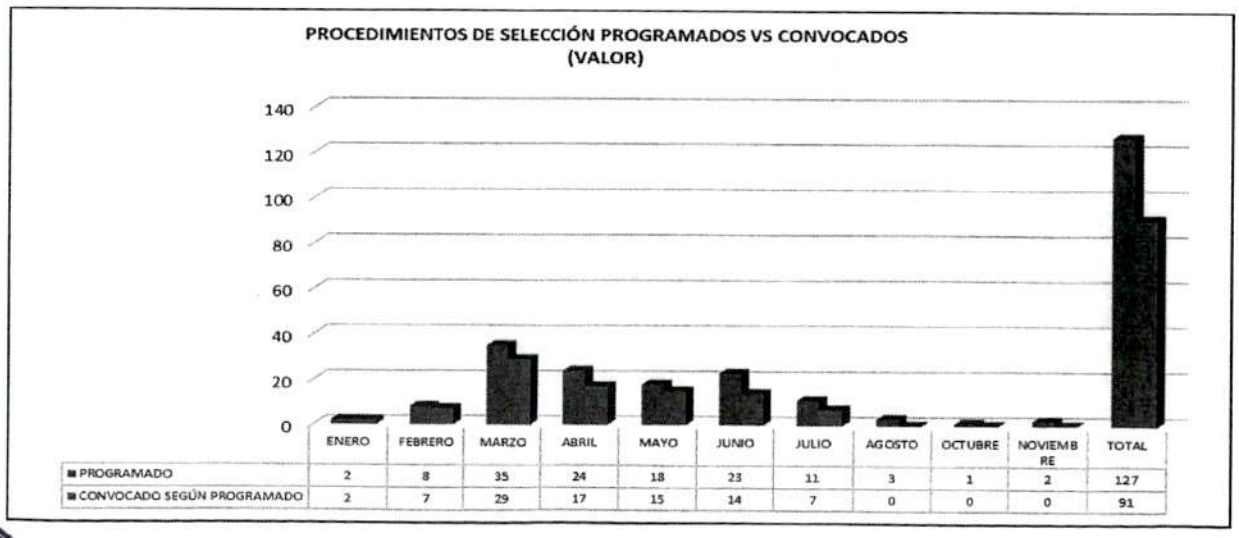

MINISTERIO DE SALUD – Andy Castillo Díaz – VºBº – OFICINA DE ABASTECIMIENTO

RELACION DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN PENDIENTES DE CONVOCAR MESES DE FEBRERO - MARZO -ABRIL -MAYO-JUNIO-JULIO 2021

N_REF	CONDICION	PROVIENE DEL PAC	RESOLUCION	FECHA RESOLUCION	Descripción	Tipo de Selección	Cant. Items	Valor Estimado PAC (En Soles)	Mes Programado	Fondo Financiamiento	OBJETO CONTRATACIÓN	AREA USUARIA	OBSERVACION
4	INCLUIDO	INICIAL	RS 012	22/01/2021	SERVICIO DE ENVIO DE CORREO MASIVO - MAILING PARA EL MINISTERIO DE SALUD	ADJUDICACION SIMPLIFICADA	1	141,600.00	ABRIL	1-00	SERVICIO	OGTI	
8	INCLUIDO	INICIAL	RS 012	22/01/2021	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES INSTITUCIONALES 2020, PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE SALUD	LICITACION PUBLICA	1	5,000,000.00	MAYO	1-00	BIEN	UBS - UNIDAD DE BIENESTAR SOCIAL	
26	INCLUIDO	4TAMODIF	RD 034	15/02/2021	ADQUISICION DE CAMAS CAMILLAS MULTIPROPOSITO TIPO UCI (150 UNIDADES)	CONTRATACION DIRECTA	1	4,800,000.00	MARZO	3-19	BIEN	DGOS	
30	INCLUIDO	4TAMODIF	RD 034	15/02/2021	ADQUISICION DE BOMBAS DE INFUSION DE DOS CANALES (550 UNIDADES)	CONTRATACION DIRECTA	1	7,865,000.00	MARZO	3-19	BIEN	DGOS	
33	INCLUIDO	4TAMODIF	RD 034	15/02/2021	ADQUISICION DE MONITOR DE FUNCIONES VITALES	CONTRATACION DIRECTA	1	3,568,345.00	MARZO	3-19	BIEN	DGOS	
34	INCLUIDO	4TAMODIF	RD 034	15/02/2021	SERVICIO DE ALQUILER DE CENTRAL TELEFONICA DE LAS SEDES DE DGOS, DIGESA Y DIGEMID DEL MINISTERIO DE SALUD	ADJUDICACION SIMPLIFICADA	1	75,000.00	MARZO	1-00 Y 2-09	SERVICIO	OGTI	
35	INCLUIDO	4TAMODIF	RD 034	15/02/2021	ADQUISICION DE CONCENTRADORES DE OXIGENO PARA ESTABLECIMIENTOS DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION DEL MINISTERIO DE SALUD	CONTRATACION DIRECTA	1	2,385,000.00	FEBRERO	3-19	BIEN	DGOS	
41	INCLUIDO	5TAMODIF	RD 060	23/02/2021	ADQUSICION DE VENTILADORES MECANICOS ADULTO PEDIATRICO (50 UNIDADES)	CONTRATACION DIRECTA	1	11,000,000.00	MARZO	3-19	BIEN	DGOS	
45	INCLUIDO	6TAMODIF	RD 088	9/03/2021	SUSCRIPCION ANUAL A LA BASE DE DATOS MUNDIAL DE DONANTES DE MEDULA OSEA	CONTRATACIÓN INTERNACIONAL	1	4,930.38	MARZO	1-00	SERVICIO	DIGDOT	
57	INCLUIDO	9NAMODIF	RD 141	31/03/2021	ADQUISICION DE BOMBAS DE INFUSION VOLUMETRICA DE DOS CANALES (275 UNIDADES)	CONTRATACION DIRECTA	1	2,337,500.00	ABRIL	3-19	BIEN	DGOS	
60	INCLUIDO	9NAMODIF	RD 141	31/03/2021	ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS COMPRA CORPORATIVA PARA ABASTECIMIENTO 2021-2022	CONTRATACION DIRECTA	2	9,121.32	ABRIL	1-00 2-09	BIEN	CENARES	
61	INCLUIDO	9NAMODIF	RD 141	31/03/2021	ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS COMPRA CORPORATIVA PARA ABASTECIMIENTO 2021-2022	LICITACION PUBLICA	1	3,600.00	ABRIL	2-09	BIEN	CENARES	
62	INCLUIDO	9NAMODIF	RD 141	31/03/2021	ADQUISICION DE DISPOSITIVOS MEDICOS - COMPRA CORPORATIVA PARA ABASTECIMIENTO 2021-2022	ADJUDICACION SIMPLIFICADA	2	51,050.00	ABRIL	1-00	BIEN	CENARES	
63	INCLUIDO	9NAMODIF	RD 141	31/03/2021	ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS - COMPRA CORPORATIVA PARA ABASTECIMIENTO 2021-2022	LICITACION PUBLICA	47	405,083.86	ABRIL	1-00 2-09	BIEN	CENARES	
65	INCLUIDO	9NAMODIF	RD 141	31/03/2021	ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS COMPRA CORPORATIVA PARA ABASTECIMIENTO 2021-2022	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	239	2,986,722.34	ABRIL	1-00 2-09	BIEN	CENARES	
91	INCLUIDO	13MODIF	RD 183	7/05/2021	ADQUISICION DE BOMBAS DE INFUSION DE DOS CANALES (150 UNIDADES)	CONTRATACION DIRECTA	1	1,605,000.00	MAYO	3-19	BIEN	DGOS	
94	INCLUIDO	14MODIF	RD 190	13/05/2021	ADQUISICIÓN DE CONCENTRADORES DE OXIGENO PARA ESTABLECIMIENTOS DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN DEL MINISTERIO DE SALUD	CONTRATACION DIRECTA	1	2,385,000.00	MAYO	1-00	SERVICIO	DGOS	
97	INCLUIDO	16MODIF	RD 202	28/05/2021	ADQUISICION DE MASCARILLAS FACIALES DE USO COMUNITARIO	CONTRATACION DIRECTA	1	2,900,000.00	JUNIO	1-00	BIEN	DGIESP	
101	INCLUIDO	16MODIF	RD 202	28/05/2021	CONTRATACION DE LA SUSCRIPCION DEL SOFTWARE DE INTELIGENCIA DE NEGOCIOS - TABLEAU	ADJUDICACION SIMPLIFICADA	1	78,632.48	JUNIO	2-09	SERVICIO	OGTI	
102	INCLUIDO	16MODIF	RD 202	28/05/2021	CONTRATACION DEL SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE AMBIENTE	ADJUDICACION SIMPLIFICADA	1	108,728.16	JUNIO	2-09	SERVICIO	DIGEMID	
109	INCLUIDO	18MODIF	RD 212	18/06/2021	ADQUISICION DE UNIFORME INSTITUCIONAL 2019 PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE SALUD - ITEM ABRIGO DE DAMAS	ADJUDICACION SIMPLIFICADA	1	518,320.00	JUNIO	1-00	BIEN	BIENESTAR	

RELACION DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN PENDIENTES DE CONVOCAR MESES DE FEBRERO - MARZO -ABRIL -MAYO-JUNIO-JULIO 2021

N_REF	CONDICION	PROVIENE DEL PAC	RESOLUCION	FECHA RESOLUCION	Descripción	Tipo de Selección	Cant. Items	Valor Estimado PAC (En Soles)	Mes Programado	Fondo Financiamiento	OBJETO CONTRATACIÓN	AREA USUARIA	OBSERVACION
110	INCLUIDO	18MODIF	RD 212	18/06/2021	ADQUISICION DE COMPRESORES DE AIRE MEDICINAL PARA ENFRENTAR LA PANDEMIA DEL CORONAVIRUS	CONTRATACION DIRECTA	1	198,400.00	JUNIO	4-13	BIEN	DGOS	
111	INCLUIDO	18MODIF	RD 212	18/06/2021	CONTRATACION DE POLIZA DE SEGURO CONTRA POSIBLES RESPOSABILIDADES DERIVADAS DE USO DE LAS VACUNAS CONTRA EL SARS-COV-2	CONTRATACION DIRECTA	1	1,276,746.39	JUNIO	1-00	SERVICIO	DGIESP	
115	INCLUIDO	19MODIF	RD 218	22/06/2021	CONTRATACION DEL SERVICIO DE ESCANEO Y DISGITALIZACION DE DOCUMENTOS DE LA DIGEMID	CONCURSO PUBLICO	1	480,000.00	JUNIO	2-09	SERVICIO	DIGEMID	
116	INCLUIDO	19MODIF	RD 218	22/06/2021	ADQUISICION DE SERVIDORES Y LICENCIA MICROSOFT SQL SERVER 2017 ENTERPRISE CORE O EQUIVALENTE PARA LA DIRECCION DE INFOSALUD	LICITACION PUBLICA	1	836,303.55	JUNIO	1-00	SERVICIO	INFOSALUD	
118	INCLUIDO	19MODIF	RD 218	22/06/2021	SUSCRIPCION A LA BASE DE DATOS DE VIGIFLOW	Contratación Internacional	1	13,755.00	JUNIO	2-09	SERVICIO	DIGEMID	
123	INCLUIDO	20MODIF	RD 223	6/07/2021	ADQUISICION DE MASCARILLAS FACIALES DE USO COMUNITARIO (30 DIAS DE PLAZO DE ENTREGA)	CONTRATACION DIRECTA	1	15,703,000.00	JULIO	1-00	BIEN	DGIESP	
124	INCLUIDO	20MODIF	RD 223	6/07/2021	ADQUISICION DE MASCARILLAS FACIALES DE USO COMUNITARIO (15 DIAS DE PLAZO DE ENTREGA)	CONTRATACION DIRECTA	8	6,660,500.00	JULIO	1-00	BIEN	DGIESP	
125	INCLUIDO	21MODIF	RD 234	16/07/2021	ADQUISICION DE MASCARILLAS FACIALES DE USO COMUNITARIO (15 DIAS DE PLAZO DE ENTREGA)	CONTRATACION DIRECTA	12	12,054,500.00	JULIO	1-00	BIEN	DGIESP	
126	INCLUIDO	21MODIF	RD 234	16/07/2021	ADQUISICION DE BIENES CONSIDERADOS EN EL PLAN DE PREPARACION Y RESPUESTA ANTE LA SEGUNDA OLA PANDEMICA POR COVID-19 (MAMELUCO)	CONTRATACION DIRECTA	1	336,000.00	JULIO	1-00	BIEN	DGOS	
